


Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предш.					
						01 Ноябрь		01 Декабрь		
						24.10	07.11	21.11	05.12	19
3	Заседание РГ 01.02.2017	1 день	Ср 01.02.17	Ср 01.02.17						
4	Список экспертов									
5	Утвердить требования к экспертам	1 день	Ср 01.02.17	Ср 01.02.17	3					
6	Определелить ресурсы и способы оповещения экспертов	1 день	Ср 01.02.17	Ср 01.02.17	5					
7	Работа с экспертами	12 дней	Чт 02.02.17	Пт 17.02.17	6					
8	Утверждение состава экспертов на СПК (допускаем заочное утверждение)	7 дней	Вт 21.02.17	Ср 01.03.17	7					
9	Обучение экспертов	1 день?	Чт 02.03.17	Чт 02.03.17	8					
11	Перечень квалификаций									
12	Формирование проекта перечня квалификаций в виде заявки	13 дней	Чт 02.02.17	Вс 19.02.17	3					
13	Утверждение на заседании СПК (допускаем заочное утверждение)	7 дней	Пн 20.02.17	Вт 28.02.17	12					
14	Заявка сформирована и предоставлена в НАРК	0 дней	Ср 01.03.17	Ср 01.03.17	13					
15	Рассмотрение и проверка заявки в НАРК	23 дней	Ср 01.03.17	Пт 31.03.17	14					
16	НАРК направляет квалификации на экспертизу	1 день	Пн 03.04.17	Пн 03.04.17	15					
17	Рассмотрение проекта в Минтруд, других СПК, профсоюзах	29 дней	Вт 04.04.17	Пт 12.05.17	16					
18	Рассмотрение проекта в Национальном совете	50 дней	Пн 15.05.17	Пт 21.07.17	17					
19	Утверждение проекта	6 дней	Пн 24.07.17	Пн 31.07.17	18					
20	Изменения редакционного характера, утверждение проекта	19 дней	Вт 01.08.17	Пт 25.08.17	19					
22	Разработка оценочных средств по соответствующим квалификациям									
23	Разработка паспорта ОС	8 дней	Пт 03.03.17	Вт 14.03.17	9;13					
24	Разработка ОС	109 дней	Пт 03.03.17	Ср 02.08.17	9;13					
25	Валидация	24 дней	Вт 01.08.17	Пт 01.09.17	24					

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предш					
						01 Ноябрь			01 Декабрь	
						24.10	07.11	21.11	05.12	19
26	Обновление (актуализация) оценочных средств	14 дней	Пн 04.09.17	Чт 21.09.17	25					
27	Утверждение ОС на СПК	5 дней	Пт 22.09.17	Чт 28.09.17	26					
28	Размещение примеров и сведений в Реестре и на сайте СПК	2 дней	Пт 29.09.17	Пн 02.10.17	27					
30	ИТ система									
31	Изучение возможностей системы	11 дней	Пн 17.07.17	Пн 31.07.17						
32	Загрузка материалов КОС в систему	6 дней	Чт 03.08.17	Чт 10.08.17	24					
33	Тестирование системы	8 дней	Пт 11.08.17	Вт 22.08.17	32					
34	Определение перечня предприятий для проведения пилотного проекта	8 дней	Ср 09.08.17	Пт 18.08.17	32					
35	Перечень предприятий определен	1 день	Пн 21.08.17	Пн 21.08.17	34					
36	Проведение пилотного проекта	20 дней	Ср 23.08.17	Вт 19.09.17	35;33;					
37	Пилотный проект проведен	1 день	Ср 20.09.17	Ср 20.09.17	36					
39	Разработка требований к экспертам центров оценки квалификаций	11 дней	Вт 22.08.17	Вт 05.09.17						
40	Разработка механизма передачи КОСов в ЦОКи	16 дней	Ср 06.09.17	Ср 27.09.17	39					
41	Передача КОС в ЦОКи	7 дней	Вт 03.10.17	Ср 11.10.17	40;28					

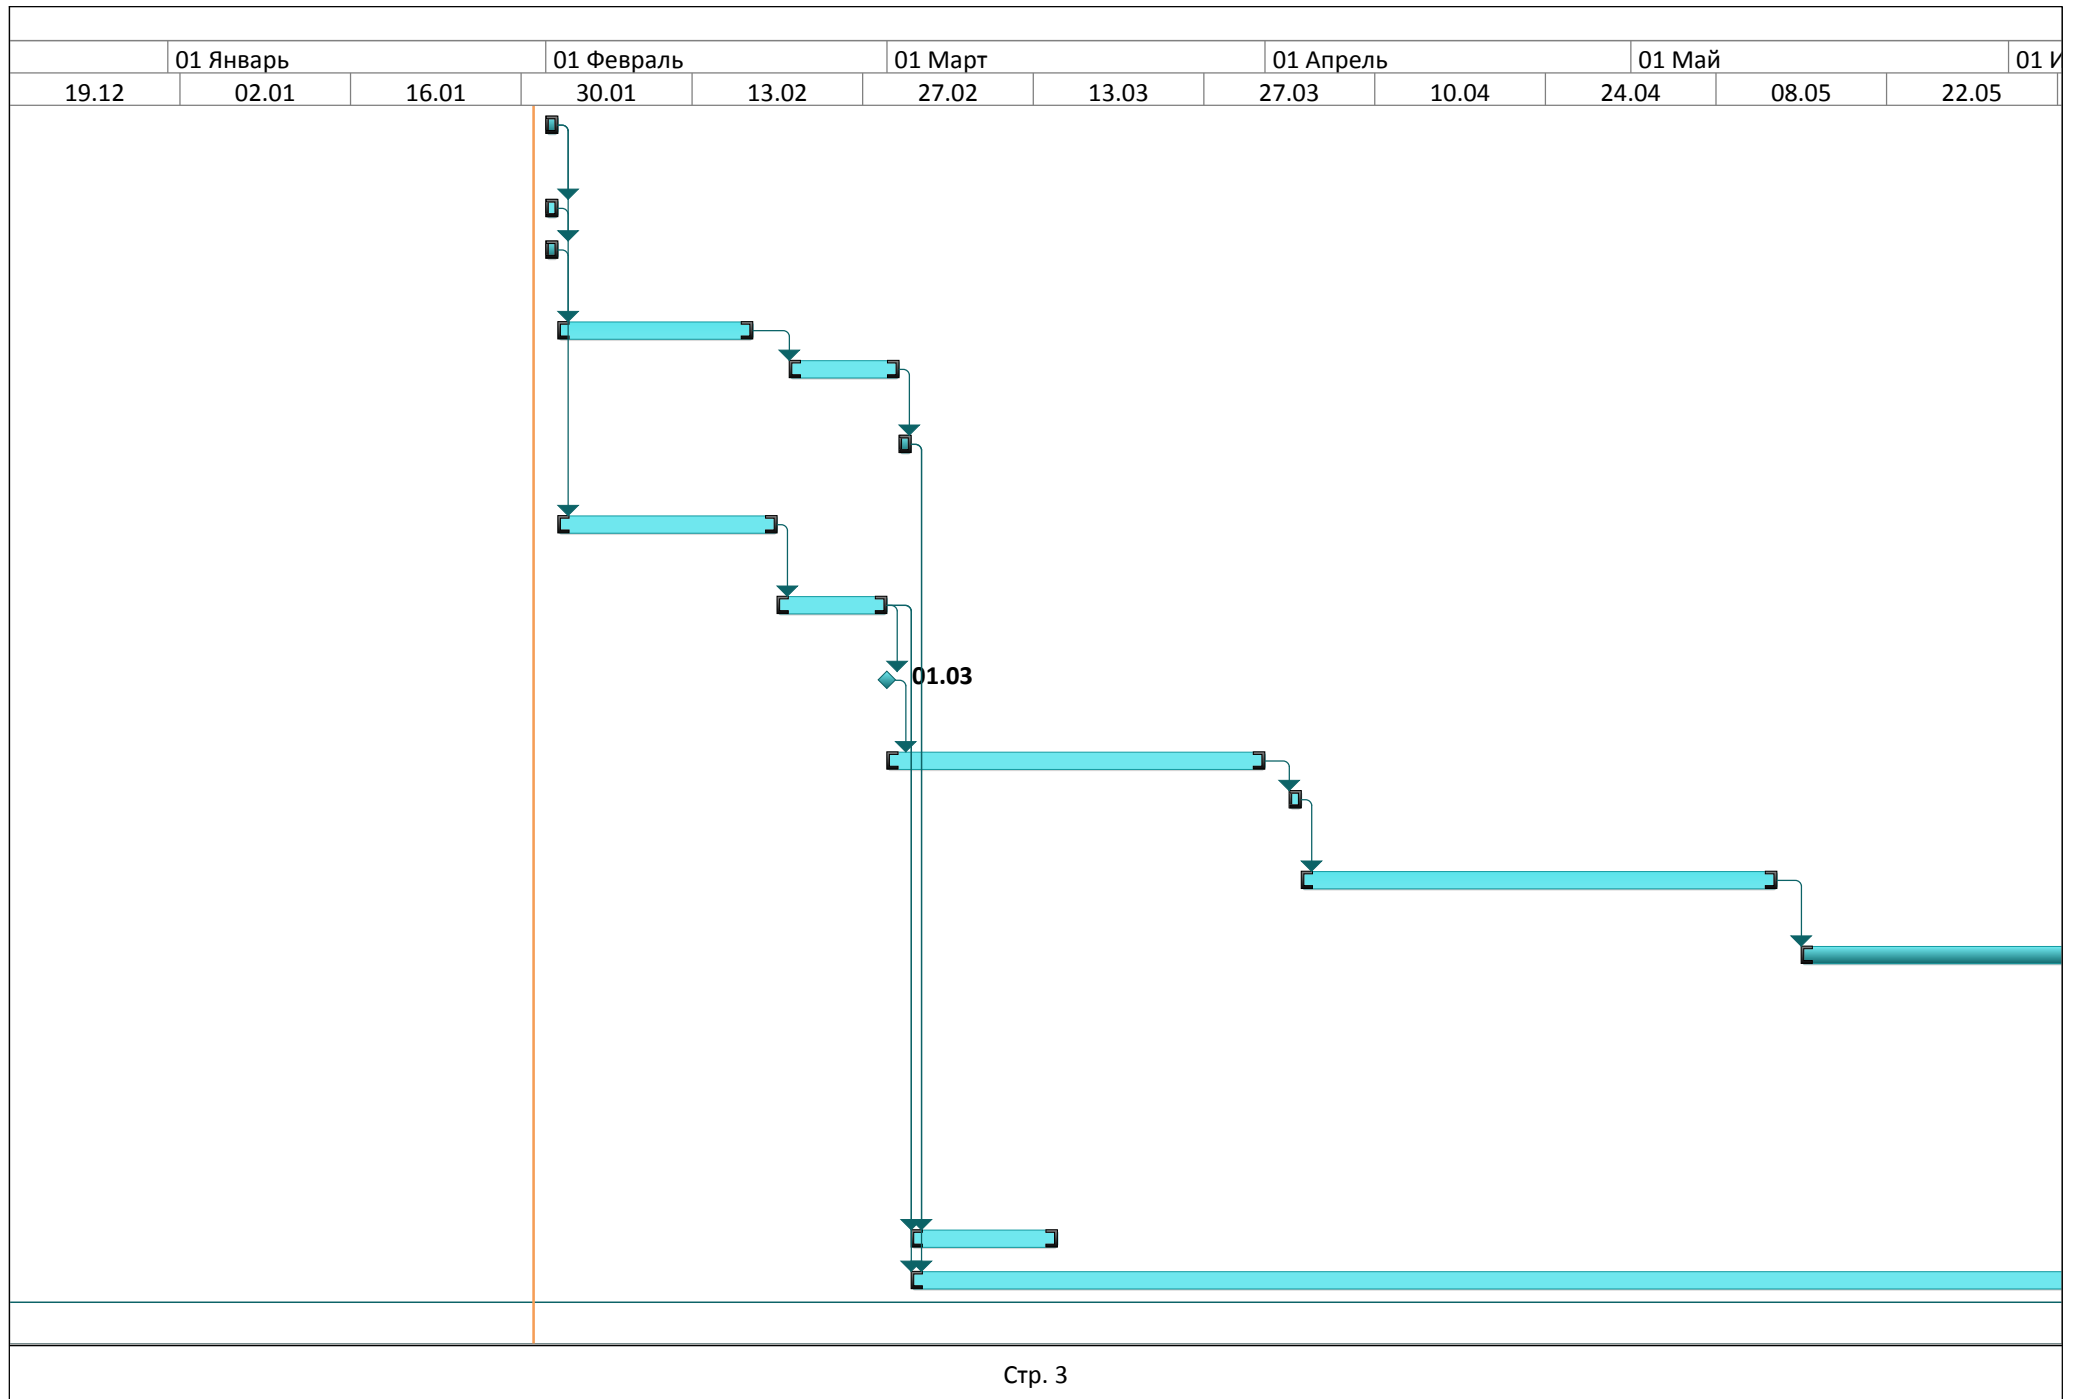

01 Январь			01 Февраль		01 Март		01 Апрель		01 Май		01 И
19.12	02.01	16.01	30.01	13.02	27.02	13.03	27.03	10.04	24.04	08.05	22.05

Юнь		01 Июль		01 Август		01 Сентябрь		01 Октябрь		01 Ноябрь	
05.06	19.06	03.07	17.07	31.07	14.08	28.08	11.09	25.09	09.10	23.10	06.11

